

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL



2014

Región XV de Arica y Parinacota
RECONSTRUCCION
CONSTRUIR UNA OPORTUNIDAD



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN



PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

7 Ejes Estratégicos

- Vivienda
- Espacios Públicos
- Educación
- Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural
- Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial
- Apoyo a la Actividad Económica
- Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales

Arica y Parinacota



Chile

Índice

Presentación

Construir una Oportunidad

Acciones en la Emergencia

En la emergencia; protección de las personas, familias y comunidades

Acciones en la Etapa de Reparación

- a)** Proceso de Normalización
- b)** Objetivos de la Intervención
- c)** Soluciones de reparación en la emergencia

- Familias Damnificadas
- Normalización Conectividad Vial
- Normalización Actividades Productivas

Etapa de Reconstrucción

- a)** Estrategia de Reestructuración
- b)** Objetivos del Plan y de Reestructuración
- c)** Programas de Reconstrucción

- **Vivienda**
- **Espacios Públicos**
- **Educación**
- **Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural**
- **Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial**
- **Apoyo a la Actividad Económica**
- **Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales**



En menos de una década,
un segundo terremoto golpea la
Región de Arica y Parinacota,
provocando daños
en las personas, sus bienes,
así como en la
infraestructura pública.

RECONSTRUCCION

CONSTRUIR UNA OPORTUNIDAD



Presentación

CONSTRUIR UNA OPORTUNIDAD





Los días 1 y 2 de abril de 2014, hubo un sismo de mayor intensidad con características de terremoto, y posterior Tsunami, grado 8.2 escala de Richter, que azoto las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. El año 2005 nuestra región se vio afectada por un sismo de iguales características. En menos de una década, un segundo terremoto golpea la región provocando daños en las personas, sus bienes, así como en la infraestructura pública.

¿Es posible que la emergencia, seguida de reconstrucción, se constituya en una oportunidad?

Es el desafío que hemos asumido como gobierno y que reflejamos en este documento; a la presencia inmediata de la Presidenta de la República y Ministros de Estado, los equipos regionales, encabezados por su Intendente, se dieron a la tarea de atender la emergencia y normalizar el funcionamiento de la región.

El plan de reconstrucción, tiene por objetivo general, comprometer un conjunto de obras y procesos, para superar los daños producidos por los sismos, contribuyendo al logro de objetivos regionales de largo alcance, definidos en el Programa de Gobierno y en el Plan Especial de Zonas Extremas.


La gestión de la reconstrucción, ha sido un esfuerzo de los equipos regionales, apoyados por sus respectivos Ministerios, quienes han dispuesto de instrumentos de actuación inmediata. Se nutre de la retroalimentación ciudadana, en tanto, recoge aspiraciones, demandas y necesidades sentidas de nuestra población.

comprometer un conjunto de obras y procesos, para superar los daños producidos por los sismos,



8,2

TERREMOTO

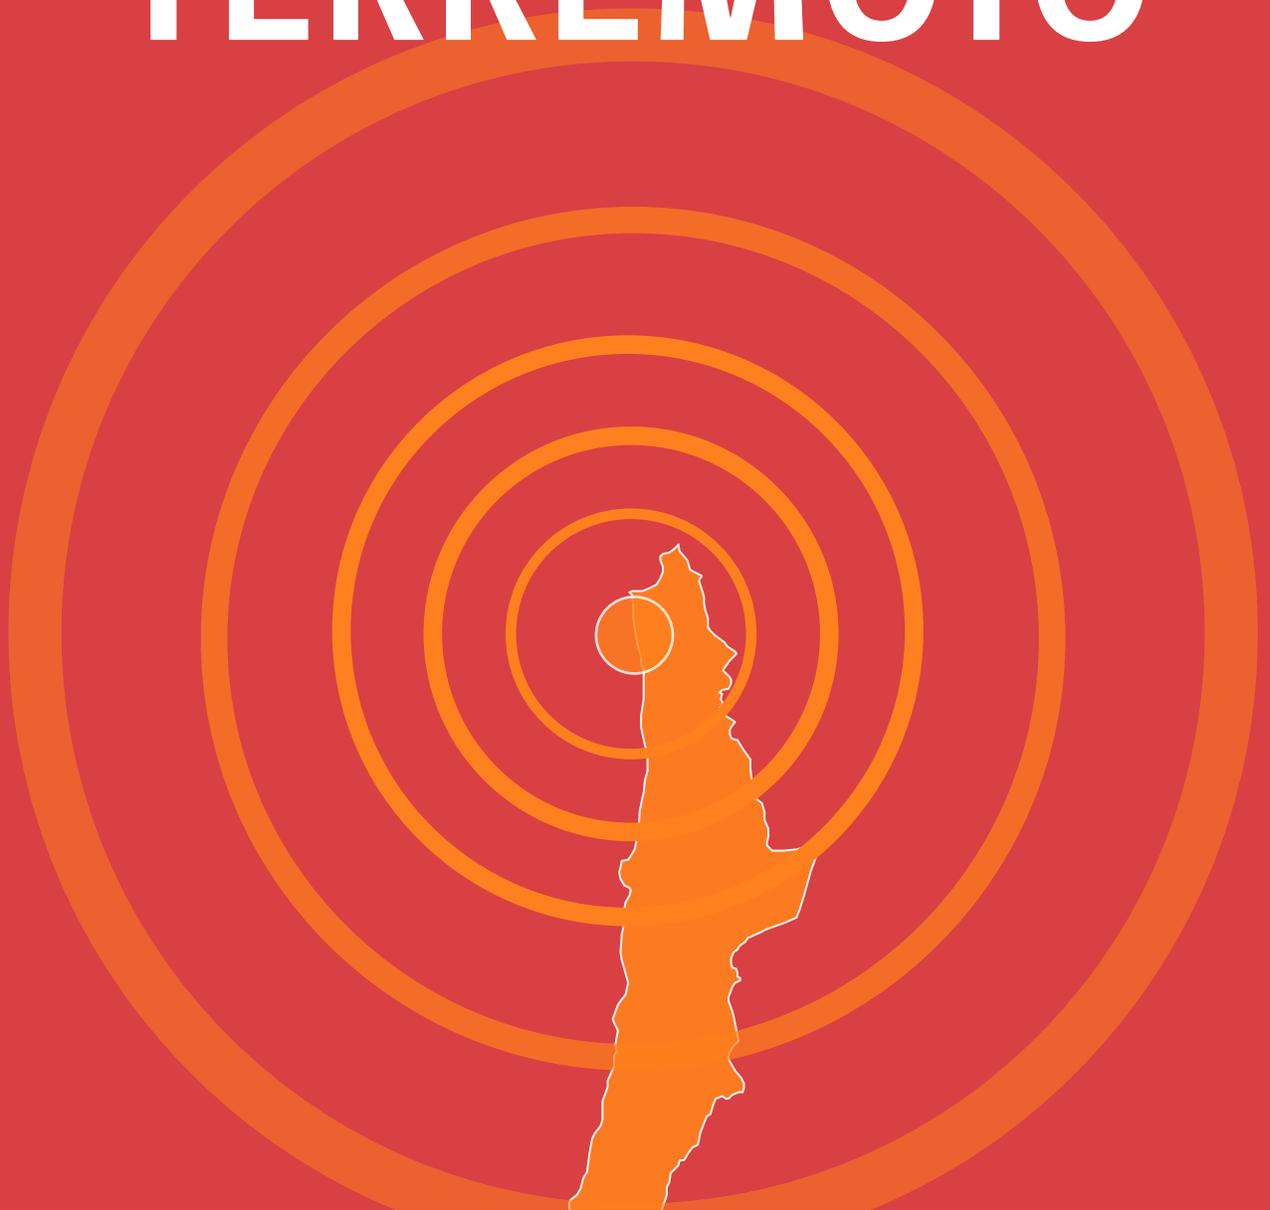

Acciones de la Etapa de Emergencia

En la Emergencia; protección de las personas, familias y comunidades





En la inmediatez de la catástrofe, se dispuso de la **conformación del Comité Regional de Emergencia**, encabezado por el Intendente Emilio Rodríguez Ponce y la Oficina Nacional de Emergencia; organizando ayuda y requiriendo el primer diagnóstico de los daños.

En la comuna de Arica, evacuaron aproximadamente 80 mil personas, desde zona inundable al sector alto de la comuna, permaneciendo por largo tiempo en zona segura.

Se trabajó en la **restitución de servicios básicos** de agua potable y electricidad.

Se habilitaron albergues en escuelas y en estadio Carlos Dittborn. Se entregó ayuda humanitaria consistente en frazadas, agua y alimento, así como hubo distribución de herramientas para remover escombros.

Se dispusieron las medidas administrativas para enfrentar la emergencia; declaración de Zona de Catástrofe median-

te Decreto Supremo N° 918 de fecha 03.04.14., a continuación el Decreto Supremo N° 925 de Interior, del 04.04.14., que nombra al Intendente responsable de organizar la ayuda, así como establece normas excepcionales para la adquisición de bienes destinados a la atención de los damnificados.

Asimismo, para garantizar la seguridad pública, se dictó el Decreto Supremo 910 de fecha 02.04.14 de Interior, que declara Estado de Excepción Constitucional, de Catástrofe, por calamidad pública, designando al General de Brigada Miguel Alfonso Bellet, como Jefe de Defensa Nacional, decreto que estuvo vigente hasta el día 17 de abril de 2014.

**En la comuna de Arica,
evacuaron aproximadamente
80 mil personas, desde zona
inundable al sector alto de
la comuna**



En la emergencia; protección de las personas, familias y comunidades

Centrarse en las persona, familias y comunidades , abordando no solo las pérdidas materiales, acompañando para mantener el patrimonio social de las familias.

Objetivo:

Apoyar a personas, familias y comunidades en situación de emergencia en las primeras horas de producida la catástrofe.

Medida:

Entrega de ayuda humanitaria consistente en entrega de abrigo, agua, alimentación y materiales de construcción para labores de emergencia, carpas y enseres para su habilitación, estanques de acumulación de agua.

Entrega de recursos para que Municipalidades de la región, hagan frente a situaciones de emergencia; despeje de vías, demolición y remoción de escombros y entregar ayuda a damnificados.

Entrega de ayuda humanitaria.

Entrega de recursos a las Municipalidades de la Región (Res. 893 del 03.04.14).
Habilitación de Albergue Estadio Carlos Dittborn.

Monto: \$ 198.692.832.

Responsable: ONEMI Regional - Subsecretaría de Interior.

Plazo:

El hito fue el Cierre de Albergue del estadio Carlos Dittborn ; el 27 de abril 2014.

Financiamiento:


05 .10 .01. 24. 03 .002 "TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- Para atender situaciones de emergencia", del presupuesto de la Subsecretaría del Interior para el año 2014.



Protegidas las familias de nuestra región, se inicia una segunda fase para la atención de familias y normalizar funcionamiento de la infraestructura de la región.



Arica y Parinacota



Acciones en la Etapa de Reparación

a) Proceso de Normalización

b) Objetivos de la Intervención

c) Soluciones de Reparación en la Emergencia

- Familias Damnificadas
- Normalizar la Conectividad Vial
- Normalizar Actividades Productivas Familiares





Protegidas las familias de nuestra región, la Presidenta de la República, luego de su visita a la zona, se inicia una segunda fase para la atención de familias y normalizar funcionamiento de la infraestructura de la región.

Se designa Delegado Presidencial; para que en el terreno mismo y bajo su responsabilidad directa, en coordinación con el Intendente Regional, resuelva en forma oportuna e integral los problemas asistenciales y de dimensión humana de las personas damnificadas y sus familias. Con atribuciones para la conducción, recuperación y reconstrucción de las comunas de Arica, Putre, Camarones y General Lagos. (Decreto Supremo N° 964 del 17.04.14).



a) Proceso de Normalización

Luego de realizado el análisis de daños en la región, realizado por todos los organismos de gobierno regional y las municipalidades; dirigidos por el Intendente Regional, se dio el trabajo mantener y resolver la prestación oportuna servicios básicos a todas las comunas, la conectividad, y la atención de familias cuyas viviendas eran inhabitables.

El espíritu de igualdad y equidad territorial fue nuestra ruta emocional para aumentar el compromiso público y privado hacia nuestros compatriotas afectados, desde las zonas con mayores oportunidades hasta las más alejadas de la región.

• Familia Damnificadas:

- Sismo produjo daños severos en 3 comunas: Arica, Camarones y Putre, muchas de las viviendas requieren intervención con valor patrimonial.
- Daños en comuna de Arica, agudizados por suelo salino, deja en evidencia problemas históricos en conjunto Guanacagua III (473 familias “casas quebradas”).

• Normalizar Conectividad Vial:

- En la vialidad regional se produjeron 13 eventos relevantes.
- En Morro de Arica, derrumbes y destrucción de sistema de contención, afectó espacios públicos, circulación peatonal y vehicular en borde costero.

el espíritu de igualdad y equidad fue nuestra ruta emocional para aumentar el compromiso público y privado

• Normalizar actividades productivas familiares:

- Daños en red de riego para 1.501 ha. / 2.005 usuarios afectados de valles de Azapa, Chaca, Camarones.
- Daños en 3 Sistemas de Agua Potable Rural; Codpa, Las Maitas y Camarones.
- Derrumbe en Canal de Azapa.
- Daños al interior de predios rurales afectando la actividad agrícola y ganadera.
- Pérdida de materiales para la pesca artesanal.





b) Objetivos de la Intervención

- Entregar asistencia a familias damnificadas.
- Normalizar el funcionamiento de servicios e infraestructura regional.

c) Soluciones de Reparación en la Emergencia

Identificadas las necesidades, daños y problemas causados; se desarrollaron medidas de reparación para dar soluciones especiales para que familias damnificadas esperen **reconstrucción en lugares seguros; garantizar conexión vial para asegurar integración territorial** y; dar apoyo a familias que su actividad económica depende de recursos hídricos para agricultura y ganadería, en su mayoría de subsistencia.



Familias Damnificadas

Mantener la dignidad de las familias y su seguridad, permitió llevar distintas respuestas, **entregando soluciones de vivienda de emergencia, construidas en los propios sitios de residencia y medidas de aseguramiento de hogares frente a daños**; la entrega de Bonos de Arriendo y apoyo para el pago de servicios básicos; Bono de acogida en Red Familiar. A ello se suma la Construcción Barrio de Emergencia habilitado con viviendas de 39 m², con red eléctrica, aislación térmica y baños conectados a red pública provisoria.

Se han entregado todas las soluciones de emergencia que se han solicitado y que corresponden a familias con daño en sus viviendas que las dejan inhabitables. A 26 días de la emergencia, en la región ya no existían albergues y/o familias en carpas.

Habilitación de Viviendas de Emergencia

Objetivo:

Apoyar a familias damnificadas adquiriendo e instalando viviendas de emergencia.

Medida:

Adquisición de viviendas de emergencia, gestionando su instalación en sitio propio y habilitando un Barrio de Emergencia.

Acciones:

Adquisición y transporte de 156 viviendas de Emergencia, con red eléctrica y aislación térmica.

Habilitación de un Barrio de Emergencia para 24 familias; viviendas desde 39 m² (2 unidades por familia), con cocina y baños individuales, habilitados con ducha, wc, lavamanos.

Habilitación de urbanización provisoria para el Barrio Emergencia, con cierre perimetral acceso vehicular y peatonal, con sede social.

Apoyo a la organización comunitaria, acceso a beneficios red protección social, para hacer sustentable habilitación en el Barrio Emergencia.

Instalación de viviendas de emergencia en sitio propio:

- Arica (47),
- Putre (11) y
- Camarones (40).
- 11 viviendas con obras de seguridad.

Monto: \$ 425.529.573

Responsable: Delegación Presidencial - ONEMI Regional - Municipalidad de Arica.

Plazo de Implementación: Agosto 2014.

Financiamiento: 05 .10 .01. 24. 03 .002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - Para atender situaciones de emergencia, del presupuesto de la Subsecretaría del Interior para el año 2014.



Entrega de ayuda en Bonos acogida en Red Familiar y; Arriendo y pago de servicios básicos:

Objetivo:

Entregar soluciones de emergencia para damnificados de vivienda.

Medida:

Entrega de Bonos de acogida en red familiar (\$200.000 mensuales), Bonos de Arriendo y pago de servicios básicos (\$250.000, sumado hasta \$50.000 por pago servicios básicos).

Acciones:

Pagos mensuales de Bonos de acogida en Red Familiar y de Arriendo y servicios básicos:

- 37 bonos de acogida en Red Familiar.
- 41 bonos de Arriendo y pago de servicios básicos.

Monto Proyectado: \$ 435.000.000

Responsable: Delegación Presidencial - Intendencia.

Plazo de Implementación: Desde Julio 2014, hasta la entrega de solución definitiva para los propietarios de las viviendas.

Financiamiento: 05 .10 .01. 24. 03 .002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- Para atender situaciones de emergencia, del presupuesto de la Subsecretaría del Interior para el año 2014.



Normalizar la Conectividad Vial

Reparación de la conectividad vial urbana, interurbana e Internacional.

Objetivo:

Rehabilitar caminos principales y locales, recuperar tránsito en toda la región.

Medida:

Realizar obras de emergencia para rehabilitar caminos en 13 puntos:

- Ruta Internacional 11-CH (km 47-127), paso Tambo Quemado: remoción de derrumbes y rodados de mediano y gran volúmen.
- Ruta A-35, acceso a Codpa: remoción de derrumbes, taludes inestables.
- Ruta 5, sector Chaca Sur (km 2009-2023): remoción de derrumbes, limpiar terrazas, reparar carpeta asfáltica y pistas de emergencia.
- Ruta 5, Cuesta Camarones: reparación derrumbes de mediano y gran volúmen.
- Ruta A-27, Azapa (km 41-51): despejar derrumbes de gran volúmen, colapso canal de regadío.
- Ruta A-31, Timar (km 51-71 y 150-162): despejar derrumbes, rehabilitar plataforma rodadura, reparar terraplenes y recuperar seguridad vial.
- Ruta A-23 General Lagos (km 36-39): despejar derrumbes de gran envergadura.
- Ruta A-15, Molinos-Sora: reparar daños en terraplenes, desquinche y sostenimiento de taludes.
- Ruta A-137, Surire: despejar derrumbes de gran envergadura y desplazamiento de talud.

- Ruta A-35, Codpa-Guañacagua (km 0-11): despejar derrumbes de gran envergadura.
- Ruta A-345 Hacienda Camarones (km 10, 63, 73-74): despejar derrumbes mayores.
- Ruta A-331 en cruces A-35, acceso Esquiña-Illapata-Cundumaya: despejar derrumbes de gran envergadura.
- Ruta A-307, Cobija (km 0-9): despejar derrumbes menores a medianos.

Acciones:

Catastro de daños.
Contratar obras de emergencia.
Ejecución de Obras.

Monto: \$ 1.281.574.000

Responsable: MOP - Dirección de Vialidad

Plazo de Implementación: 100% ejecutadas.

Financiamiento: Fondos Sectoriales, Dirección Vialidad MOP.



Normalizar Actividades Productivas Familiares

Atender las dificultades de familias agricultoras, ganaderas y pescadores artesanales, que vieron interrumpida sus actividades, por daños en sus predios e infraestructura de riego, sus sistemas de cultivo y pérdida de materiales para la pesca artesanal. Familias con una matriz cultural principalmente Aymara en actividades agrícolas y ganaderas.

NORMALIZAR SUMINISTRO AGUA POTABLE RURAL.

Objetivo:

Garantizar continuidad en suministro de Agua Potable en localidades de Codpa, Las Maitas, Camarones.

Medida:

Contratar obras de emergencia para reparar sistemas de Agua Potable Rural en localidades de Codpa, Las Maitas, Camarones.

Acciones:

Catastro de daños.
Contratar obras de emergencia.
Ejecución de Obras.

Monto: \$ 77.053.000

Responsable: MOP - Dirección Regional Obras Hidráulicas.

Plazo de Implementación: 100% Ejecutadas a Junio de 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales Dirección Obras Hidráulicas MOP.

REESTABLECER INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SIST. DE CULTIVOS.

Objetivo:

Atender emergencia en Canal de Azapa garantizando agua para el riego

Medida:

Contratar obras de emergencia en Canal de Azapa, garantizando continuidad en la provisión de agua de riego.

Acciones:

Despeje de derrumbes, retiro de escombros, reposición de 100 ml de tuberías entre km 41 y 43 de Ruta A-27.

Monto: \$ 30.000.000.

Responsable: MOP - Dirección Regional Obras Hidráulicas.

Plazo de Implementación: 100% Ejecutada a Mayo 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales Dirección Obras Hidráulicas MOP.



Objetivo:

Apoyar a familias que tuvieron daños al interior de sus predios. Restablecer infraestructura de riego y sistema de cultivos.

Medida:

Entrega de Bonos para reparar infraestructura de riego y agricultura dañada y adquirir elementos.

Acciones:

Entrega de bonos aportes de INDAP a 74 familias, que recibieron hasta \$ 300.000 para acciones intraprediales. Aportes entregados por \$ 13.600.000.

Financiamiento a 27 proyectos de obras de emergencia para 115 usuarios, por hasta \$ 15.000.000 por comunidad.

Aportes entregados por \$ 76.900.000. Total de 189 usuarios atendidos.

Monto: \$ 90.641.173.

Responsable: SEREMI de Agricultura - INDAP.

Plazo de Implementación: Abril a Septiembre 2014.

Financiamiento: Fondos Sectoriales INDAP.

APOYO A PESCADORES ARTESANALES

Objetivo:

Apoyar a pescadores artesanales que tuvieron daños y pérdidas de elementos para realizar su actividad.

Medida:

Adquisición de elementos "artes de pesca" para asociados del Sindicato de Pescadores Artesanales de Arica.

Acciones:

Catastro de requerimientos, compra de elementos.

Entrega de aportes al Sindicato de Pescadores.

Monto: \$ 32.000.000.

Responsable: SERNAPESCA.

Plazo de Implementación: Abril - Mayo 2014.

Financiamiento: Subsecretaría de Pesca





Arica y Parinacota



2014

RECONSTRUCCION

CONSTRUIR UNA OPORTUNIDAD



Etapa de Reconstrucción

a) Estrategia de Reconstrucción

b) Objetivos del Plan de Reconstrucción

c) Programas de Reconstrucción:

- Vivienda
- Espacios Públicos
- Educación
- Fortalecer Agricultura y uso de Recursos hídricos con pertinencia cultural
- Asegurar Integración Territorial, Conectividad Vial
- Apoyo a la Actividad Económica
- Apoyo a las Capacidades de Gobiernos Locales





a) Estrategia de Reconstrucción

La reconstrucción en la Región de Arica y Parinacota representa un desafío para su gente, que vive desde el mar hasta el altiplano, que convive con diversas culturas, una región extensa, con límites fronterizos. **La reconstrucción de pueblos y ciudades exige contribuir a su desarrollo económico y social, inversiones en infraestructura, apalancar procesos productivos, para promover la competitividad de las comunidades y su mejor preparación frente a futuros desastres naturales.**

Además de un proceso descentralizado en cuanto a la ejecución de iniciativas, mejorando las capacidades regionales y municipales, coordinando con ellos, conforme a sus capacidades para abordar zonas disímiles en su geografía, economía y cultura.

El diseño del Plan de Reconstrucción es un trabajo que se desarrolla a partir de los diagnósticos de daños, realizados por los diversos servicios públicos de la región que dieron origen a los proyectos presentados por los equipos regio-

nales para abordar la reconstrucción.

Hemos organizado el plan de reconstrucción, conforme a objetivos estratégicos, que forman parte de prioridades de gobierno, hemos buscado que las iniciativas tengan **coherencia con las iniciativas definidas en el Plan Especial de Zonas Extremas**, ya que cuenta con la legitimidad de haberse definido en un proceso ciudadano, participativo e inclusivo, **instrumento de gestión que ya cuenta con 548.269 millones de pesos.** Aportaremos en el mismo sentido de sus nodos estratégicos; “generación de niveles básicos de desarrollo” y “desarrollo estratégico y fomento productivo”; mejorar acceso a servicios básicos, a la conectividad vial, contribuir al poblamiento del altiplano, favorecer inversión pública en dichos territorios; favorecer el turismo, el patrimonio e identidad cultura, playas con infraestructura de calidad.





...cumpliremos con los compromisos de la región y desafíos post terremoto.

b) Objetivos del Plan de Reconstrucción

- **Mejorar las condiciones** de vida de los damnificados, afectados con daños mayores y menores en sus viviendas; reconstruyendo y reparando viviendas, haciéndolo con pertinencia cultural y patrimonial en comunas de Putre y Camarones.
 - **Fortalecer la dinámica socioeconómica** de sectores afectados por la catástrofe, turismo y emprendimientos en recintos dañados.
 - **Fortalecer capacidades locales** para enfrentar emergencias.
 - **Facilitar la integración territorial**, mejorando conectividad vial, recuperando e incorporando mayor estándar de seguridad en la red dañada.
 - **Fortalecer escala ciudad**, con espacios públicos de calidad; reparando espacios públicos dañados.
 - **Recuperar infraestructura** para la educación pública; daños en escuela básica municipal y universitaria.
 - **Mejorar infraestructura de riego para la agricultura**, dando uso eficiente de los recursos hídricos, promoviendo la matriz sociocultural – patrimonial de la agricultura regional.
- Los planes e iniciativas han sido desarrollados por el conjunto de instituciones de gobierno, usando mecanismos de financiación existentes, sin afectar iniciativas comprometidas o por comprometer.
- Cada ámbito de acción se ha trabajado con enfoque de grupos de interés, para ello, hemos gestionado los planes en base a principios de:
- **Participación**
 - **Articulación de actores**
 - **Rendición de cuentas**



b) Programa de Reconstrucción

Vivienda

Para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los damnificados, afectados con daños mayores y menores en sus viviendas; reconstruyendo y reparando viviendas, haciéndolo con pertinencia cultural y patrimonial en comunas de Putre y Camarones.

El Serviu de Arica y Parinacota, mantiene catastro de viviendas y familias con daños. Desarrolla procesos participativos para implementar soluciones; **reparación de viviendas, reconstrucción de viviendas y reconstrucción conjunto Guañacagua III en la comuna de Arica.** A ello se suma la complejidad de construir en comunas de Putre y Camarones, habrá que hacerlo promoviendo el valor patrimonial de ellas.

- REPARACIÓN DE VIVIENDAS.
- RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS.
- RECONSTRUCCIÓN POBLACIÓN GUAÑACAGUA III.
- REMEDIACIÓN TERRENOS POBLACIÓN GUAÑACAGUA III.



Mejorar las condiciones de vida de los damnificados, construyendo y reparando sus viviendas con estándares de seguridad y pertinencia cultural reparando sus viviendas.



REPARACIÓN DE VIVIENDAS:

Objetivo:

Mejorar calidad de vida de quienes tuvieron daños en sus viviendas, mediante la reparación de viviendas con daño menor y mayor.

Medida:

- Reparar viviendas, mediante Subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (recursos aprobados mediante Res. Minvu N° 2671 del 08.05.14).
- Subsidios especiales, tratándose de viviendas emplazadas en suelo salino y de valor patrimonial.

Monto Asignado a la medida:

\$ 7.221.900.000

Responsable: MINVU - SERVIU Arica y Parinacota.

Plazo de Cierre: Diciembre 2015.

Fuente Financiamiento: Recursos sectoriales Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Acciones:

Hitos	Plazos
Catastro de viviendas dañadas de 1.874 familias	Junio 2014
Asignación de recursos Programa Protección Patrimonio Familiar (Res. Minvu N° 2671 del 08.05.14.)	Mayo 2014
4 selecciones para aprobar proyectos y asignar subsidios a familias.	30 de junio, 29 de Agosto, 30 de Octubre y 22 de Diciembre.
Inicio de obras.	Agosto 2014
Acompañamiento al diseño y ejecución de proyectos con valor patrimonial en comunas de Putre y Camarones.	Todo el periodo
Ejecución de proyectos.	Diciembre 2015.



RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS :

Objetivo:

Mejorar calidad de vida de quienes tuvieron daño mayor en sus viviendas, con pérdidas totales, reconstruir viviendas con daño mayor no reparable y/o adquirir viviendas.

Medida:

- Reconstrucción de viviendas mediante Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda construcción en sitio propio y/o Programa Integrado de Subsidio Habitacional para la adquisición de viviendas.
- Subsidios especiales, adicionales, tratándose de viviendas emplazadas en suelo salino y de valor patrimonial.

Monto Asignado a la medida:

\$ 1.636.964.000.

Responsable: MINVU - SERVIU Arica y Parinacota.

Plazo de Cierre: Diciembre 2015.

Fuente Financiamiento: Recursos sectoriales Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Acciones:

Hito	Plazos
Catastro de 80 familias afectadas.	Junio 2014
Asignación de recursos a la región (Res. MINVU N° 3134 de 28.05.14.)	Mayo 2014
Selecciones mensuales para asignar subsidios.	Desde junio en adelante
Acompañamiento al diseño y ejecución de proyectos con valor patrimonial en comunas de Putre y Camarones.	Desde junio en adelante
Inicio de obras - adquisición viviendas.	Desde Junio en adelante
Ejecución de proyectos.	Diciembre 2015



RECONSTRUCCIÓN POBLACIÓN GUAÑACAGUA III :

Objetivo:

Reconstrucción de la Población Guañacagua III, gravemente afectada por terremoto, emplazada sobre suelo salino, con deterioro progresivo y dinámico.

Medida:

Reconstrucción de la Población Guañacagua III (473 viviendas); en terreno colindante, con viviendas de mejor estándar y calidad de las que originalmente recibieron, gestión con acuerdo de familias beneficiadas.

Acciones:

Monto Asignado a la medida:

\$ 12.525.181.900.

Responsable:

MINVU - SERVIU.

Plazo de cierre:

2º semestre 2016.

Fuente Financiamiento: Recursos sectoriales Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Hitos	Plazos
Transferencia de Terreno de Bienes Nacionales. Disponer de 9 ha. mediante transferencia desde de Bienes Nacionales a Serviu.	Junio 2014
Estudio de suelo, previo al diseño de proyectos de construcción. Contratado mediante Res. Minvu N° 3267 de fecha 03.06.14.	Agosto 2014
Acuerdo proyecto técnico constructivo con mesa de trabajo y familias. Diseño de proyecto de vivienda y loteo con participación ciudadana; mesa de trabajo conformada con Juntas de Vecinos y asambleas.	Agosto 2014
Contrato empresa constructora.	Diciembre 2014
Inicio de Obras.	Enero 2015
Ejecución de Obras	2º Semestre 2016



• **REMEDIACIÓN TERRENOS POBLACIÓN
GUAÑACAGUA III :**

Objetivos:

Remediar terrenos correspondiente a Guañacagua III.

Responsable: Seremi de Vivienda y Urbanismo - SERVIU Arica y Parinacota

Plazo de cierre: Segundo Semestre 2016.

Medida:

Demoler viviendas que se deshabitan, remediar uso de suelo y diseñar Plan de Manejo nuevos usos.

Fuente Financiamiento: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Monto Asignado a la medida:

\$ 655.500.000

Acciones:

Hitos	Plazos
Formular Iniciativa de Inversión remediación de suelo.	Agosto 2014
Estudio Diagnóstico de reconversión urbana. Ficha IDI N° 30324672-0 Normalización 473 viviendas y demolición.	Diciembre 2015
Proceso de gestión de suelo; remediación y reconversión urbana. Ficha IDI N° 30324422-0. Diagnóstico Reconversión Urbana.	2° Semestre 2016



Espacios Públicos

Para cumplir objetivo de “Fortalecer escala ciudad, con espacios públicos de calidad; reparando espacios públicos dañados”; se proyectan obras en **Playas Lisera, El Laucho, Estudio Ex Isla Alacrán; reparación de Monumento Nacional Edificio Casa Cultura Municipal Ex Aduana y reparación Morro Arica** y sus espacios peatonales.

A los estudios técnicos para diseñar soluciones técnicas, corresponde asignar recursos, gestionar sus autorizaciones, contratar y ejecutar las siguientes obras:

- **MONUMENTO HISTORICO MORRO DE ARICA.**
- **RECUPERAR CASA DE LA CULTURA - EDIFICIO EX ADUANA.**
- **REHABILITAR PLAYA LA LISERA Y EL LAUCHO, ESTUDIO EX-ISLA DEL ALACRÁN.**



Fortalecer escala ciudad,
con espacios públicos de
calidad; reparando espacios
públicos dañados.



• MONUMENTO HISTORICO MORRO DE ARICA:

Objetivo:

Recuperar seguridad ante riesgo de nuevos derrumbes, recuperando la circulación peatonal en Morro de Arica, borde costero de uso recreacional.

Medida:

Contratar obras para remover material de rocas de gran tamaño; rehabilitar foso para recibir derrumbes; recuperar barrera de contención peatonal en ladera poniente del Morro de Arica.

Responsable: MOP - Dirección Regional de Vialidad.

Plazo de cierre: Noviembre 2014.

Fuente Financiamiento: 05 .10 .01. 24. 03 .002 "TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS- Para atender situaciones de emergencia", del presupuesto de la Subsecretaría del Interior para el año 2014.

Monto Asignado a la medida:

\$ 1.531.506.200.

Acciones:

Hitos	Plazos
Asignar financiamiento con recursos de emergencia del Ministerio del Interior (Res. 1.294 de 22.05.14).	Mayo 2014
Gestionar autorizaciones de obras, por ser un Monumento Histórico, administrado por el Ejército; Dirección de Fronteras y Monumentos Nacionales.	Mayo 2014
Contratar obras	Junio 2014
Ejecución de obras.	Noviembre 2014



▪ **RECUPERAR CASA DE LA CULTURA -
EDIFICIO EX ADUANA:**

Objetivos:

Recuperar patrimonio arquitectónico en centro de la ciudad.

Responsable: MOP - Dirección Regional de Arquitectura

Plazo de cierre: Período 2015.

Medida:

Contratar la reparación por daños en edificio Monumento Histórico Ex Aduana, actual Casa de Cultura Municipal (inmueble que es parte de Plan Especial Zonas Extremas).

Fuente Financiamiento: SUBDERE - Programa Puesta en Valor Patrimonio.

Monto Asignado a la medida:

\$ 1.076.347.000

Acciones:

Hito	Plazo
Proyecto de reparación patrimonial.	Julio 2014
Evaluación del Proyecto. ▪ Proyecto abordado por medio del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio, es parte de los proyectos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, pero que producto del terremoto, al ver agudizado daños, debe ser reparado en lo inmediato. ▪ Renovación destinación a Municipalidad desde Seremi de Bienes Nacionales, mediante Res. Exta. N° 0478 de fecha 10.06.14.	Agosto 2014
Aprobación recursos del Programa Puesta en Valor del Patrimonio por Consejo Regional.	Noviembre 2014
Contratación de obras.	Diciembre 2014
Ejecución de obras	Diciembre 2015



• REHABILITAR PLAYA LA LISERA, EL LAUCHO Y EX-ISLA ALACRÁN:

Objetivo:

Rehabilitar infraestructura para el desarrollo del turismo, recuperando balnearios El Laucho y La Lisera.

Medida:

Contratar obras para reparación de infraestructura de Playa y equipamiento dañado por tren de olas de tsunami en Balnearios El Laucho y La Lisera.

Balneario El Laucho y Ex-Isla Alacrán: eliminar contaminación por material rocoso de canto filoso; recuperar rejas perimetrales, recuperar plataformas peatonales de madera, recuperar perfil de arena en la playa.

Balneario La Lisera: recuperar perfil de diseño de playa artificial, eliminando afloramiento de roca, recuperar pavimentos peatonales, rehabilitar sistema de alcantarillado en baños públicos, descontaminar playa y fondo marino de roca de menor tamaño.

Estudio Diagnóstico Balnearios Laucho y Lisera: Realizar Topo-batimetría, comparando el modelo de terreno que se pueda obtener en relación a estudios anteriores. Lo que evalúa el estado de las obras marítimas y arenas de estas playas.

Monto Asignado a la medida:

\$ 518.000.000

Responsable: MOP - Dirección Regional de Obras Portuarias.

Plazo de cierre: Diciembre 2014.

Fuente Financiamiento: Fondos Sectoriales Dirección Obras Portuarias del MOP.

Acciones:

Hitos	Plazos
Licitar obras.	Julio 2014
Contratar obras.	Agosto 2014
Inicio de Obras.	Septiembre 2014
Ejecución obras	Diciembre 2014



Educación

Para dar cumplimiento al objetivo de “Recuperar infraestructura para la educación pública; daños en escuela básica municipal y universitaria”. Abordaremos la **conservación de Escuela Municipal Regimiento Rancagua y al conjunto de daños de infraestructura y equipamiento de la Universidad Pública de Tarapacá.**

- **RECUPERACIÓN ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA.**
- **RECUPERAR INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD PÚBLICA.**



Recuperar infraestructura para la educación pública; daños en escuela básica municipal y universitaria.



• RECUPERACIÓN ESCUELA REGIMIENTO RANCAGUA :

Objetivos:

Reparar Escuela Municipal Regimiento Rancagua, afectada por daños estructurales y derrumbes parciales.

Medida:

Contratar obras para la conservación de la Escuela Regimiento Rancagua, reparando daño estructural y derrumbe de escalera.

Monto Asignado a la medida:

\$ 679.268.000.

Responsable: SEREMI de Educación - Municipalidad de Arica.

Plazo de cierre: Febrero 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo de Infraestructura Escolar, MINEDUC.

Acciones:

Hitos	Plazos
Formulación de proyecto técnico de reparación. Evaluación proyecto en Gobierno Regional.	Mayo 2014
Proyecto presentado por Municipalidad de Arica, apoyado por Seremi de Educación.	Junio 2014
Aprobación proyecto en CORE. (en sesión del 21 de julio, por ser abordado por el Fondo de Infraestructura Escolar).	Julio 2014
Contratación de obras	Octubre 2014
Inicio de obras.	Octubre 2014
Ejecución obras	Marzo 2015



RECUPERAR INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD PÚBLICA:

Objetivos:

Recuperar infraestructura dañada en Universidad de Tarapacá.
Reparar daños estructurales en edificios, equipos y mejorar seguridad en Universidad de Tarapacá.

- Reparación en pavimentos Edificio Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Sistemas.
- Compra de Equipos.**

Medida:

- Reparación daño estructural en Edificio Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Construcción Escalera de Emergencia en Edificio Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Reparación daño estructural Edificio Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
- Reparación daños en muros y vigas Edificio Escuela Ingeniería Mecánica.
- Reparación en pilares, muros y escaleras Edificio Anexo Biblioteca.
- Construcción cierre perimetral en Hogar Universitario.
- Reparación muro-ventanal de Edificio Biblioteca.

Monto Asignado a la medida:

\$ 508.393.000.

Responsable: MINEDUC - UTA.

Plazo de cierre: Marzo 2015.

Acciones:

Hitos	Plazos
Cartera de proyectos a financiar.	Junio 2014
Modificación presupuestaria Mineduc.	Agosto 2014
Asignación recursos UTA.	Octubre 2014
Contrato de obras.	Diciembre 2014
Inicio y ejecución de obras	Junio 2015



Fortalecer Agricultura Regional y Uso de Recursos Hídricos

Para cumplir el objetivo de **“Mejorar infraestructura de riego para la agricultura, dando uso eficiente de los recursos hídricos, promoviendo matriz sociocultural - patrimonial de la agricultura”**. Hemos dispuesto aportar a infraestructura de riego dañada en Comunidades Indígenas, construir obras en Canal Lluscuma de la comuna de Putre, así como un concurso para financiar reparaciones de daños en obras civiles de riego.

- CONCURSO DE OBRAS DE RIEGO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS.
- OBRAS CIVILES CANAL LLUSCUMA.
- FORTALECER ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO.



Mejorar infraestructura de riego para la agricultura, dando uso eficiente de los recursos hídricos, promoviendo la matriz sociocultural - patrimonial de la agricultura regional.



• CONCURSO DE OBRAS DE RIEGO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS:

Objetivo:

Fortalecer capacidad productiva de Agricultura en Comunidades Indígenas afectadas por terremoto.

Responsable: CONADI

Plazo de cierre: Marzo de 2015.

Medida:

Financiar proyectos de reconstrucción de infraestructura de riego, dirigido a Comunidades Indígenas, mediante concurso de proyectos.

Fuente Financiamiento: Fondo de Tierras y Aguas CONADI.

Monto Asignado a la medida:

\$ 250.000.000.

Acciones:

Hitos	Plazos
Catastro de daños.	Abril 2014
Convocatoria al concurso. 1er Concurso Emergencia obras de riego de CONADI: RES. 785 del 08.07.14. Adjudica 5 proyectos por \$143,140,681: <ul style="list-style-type: none">Comunidad del Pueblo de Pachica, Camarones: reparación y reforzamiento de vertientes comunitarias.Comunidad Aymara de Cochiza, Camarones: Reparación de cruce aéreo Inquilta y unificación canal.Comunidad Aymara de Ticnamar: reconstrucción canal Alfalfane y Bocatoma canal Tumaya.Comunidad Aymara de Ticnamar: construcción de 2 acueductos aéreos y gaviones de protección.Comunidad Indígena del Pueblo de Camarones: reparación obras de protección ramal Las Heras del canal Las Casas.	Junio 2014
2do Concurso Emergencia obras de riego de CONADI: En evaluación la adjudicación de 6 proyectos por \$106.859.319: <ul style="list-style-type: none">Comunidad Rudy Yucra Ape:, LLuta, Arica: reparación de lámina de estanque acumulador.Comunidad Chucuruma, Socoroma, Putre: reparación de canales: pueblo Socoroma, Chicagua, Del Cerro, Mancaruma, localidad Socoroma.Comunidad Esquiña, Camarones: reparación canal Amasaca 2.Comunidad de Livilcar, Arica: reparación canal pueblo Livilcar.Comunidad de Esquiña, Camarones: reconstrucción canal Ñeque Ñeque.Comunidad de Illapata, Camarones: reconstrucción y reparación canal Umaxo.	
Adjudicación de proyectos.	Julio 2014
Ejecución de obras.	Diciembre 2014



• **OBRAS CIVILES CANAL LLUSCUMA:**

Objetivos:

Fortalecer capacidad productiva de Agricultura en sector Lluscuma, en la comuna de Putre.

Aymara. Asegura riego de 37 ha distribuidas en 80 predios, preferentemente con cultivos de Alfalfa y Orégano.

Medida:

Diseñar, contratar y ejecutar obras para solución técnica para captación de aguas en bocatoma y canal de conducción de aguas, cortes, construcción de gaviones, dotando de agua de riego y consumo a toda la comunidad, de origen

Monto Asignado a la medida:

\$ 214.360.589

Responsable: Dirección Regional de Obras Hidráulicas.

Plazo de cierre: Septiembre de 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Acciones:

Hitos	Plazos
Perfil de proyecto. Reconstrucción bocatoma.	Julio 2014
Ingreso sistema de inversiones.	Julio 2014
Definir fuente de financiamiento.	Octubre 2014
Contratar obras.	Febrero 2015
Ejecución de obras	Septiembre 2015



• **FORTALECER ACCIONES DE MEJORA-
MIENTO DE RIEGO:**

Objetivos:

Fortalecer capacidad productiva de agricultura regional, mediante acciones de mejoramiento de obras de riego, vulnerables a la acción de terremotos, que son parte de catastro de daños.

Medida:

"Concurso de fomento al riego para financiar obras Civiles y Daños Terremoto", Permite financiar obras civiles, mejoramiento de canales, pozos profundos o someros. Monto disponibles hasta 15.000 UF por proyecto.

Monto Asignado a la medida:

\$ 799.053.836.

Responsable: Comisión Nacional de Riego.

Plazo de cierre: Julio 2015.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Comisión Nacional de Riego.

Acciones:

Hitos	Plazo
Aprobación convenio Comisión Nacional de Riego.	Julio 2014
Concurso fomento al riego "Obras Civiles y Daños Terremoto": Res. Nº 2203 de fecha 23.07.14 que convoca concurso.	Julio - Agosto 2014
Acompañamiento en la formulación de proyectos, acompañamiento a identificados en catastro.	Julio - Agosto 2014
Evaluación y adjudicación de proyectos.	Octubre 2014
Inicio y ejecución de obras	Diciembre 2014 Julio 2015



Asegurar Integración Territorial y Conectividad Vial

Para dar cumplimiento a objetivo de “Facilitar la integración territorial, mejorando conectividad vial, recuperando e incorporando mayor estándar de seguridad en la red dañada”, se han considerado un conjunto de obras en la red vial, en ruta internacional, y especialmente en la conectividad intrarregional.

• RECUPERAR SEGURIDAD VIAL EN 14 OBRAS.



Facilitar la integración territorial, mejorando conectividad vial, recuperando e incorporando mayor estándar de seguridad en la red dañada.



• RECUPERAR SEGURIDAD VIAL EN 14 OBRAS:

Objetivo:

Recuperar estándar de seguridad vial en red regional de rutas que tuvieron daños y/o que representan riesgo.

Medida:

- Ruta A-35, Codpa (km 40-42): estabilización de taludes, malla, desquinche, señales de seguridad vial.
- Ruta 5, Cuesta Chaca Norte: colocación de mallas.
- Ruta 5, Cuesta Camarones: colocación de mallas.
- Ruta 5, Cuesta Camarones: colocación de mallas(otro tramo).
- Ruta A-27, Azapa (km 41-51): remoción de material inestable y corte TCN.
- Ruta A-31, Timar (km 51-71): reparación de terraplenes, reposición de señales.
- Ruta A-31, Timar (km 150-162): reparación de terraplenes, reposición de señales.
- Ruta A-23, General Lagos: estabilizar taludes mediante mallas y desquinche, reconformación de terraplenes, reparación señalética y seguridad vial, reposición muros contención.
- Ruta A-15, Molinos - Sora: reparar taludes y terraplenes.
- Ruta A-137, Surire: reconformar terraplen, protección de enrocado y talud.

- Puente Camarones, Ruta 5, Cuya: alineación de estructura.
- Ruta A-315, Codpa-Guañacagua: desquinche, recebo.
- Ruta A-345, Hacienda Camarones: estabilización de taludes, terraplenes, preparación subrazante.
- Ruta 11-CH, Tambo Quemado (km 116): reposición de carpeta asfáltica, enrocado de protección, reposición barreras metálicas y gaviones.

Monto Asignado a la medida:

\$ 10.613.818.000.

Responsable: MOP Dirección Regional de Vialidad.

Plazo de cierre:

11 Obras Diciembre 2014.
3 Obras Julio 2015.

Fuente Financiamiento: Fondos Sectoriales, Dirección Vialidad del MOP.

Acciones:

Hitos	Plazos
Catastro de obras a realizar.	Abril 2014
Contratación de obras.	Julio - Agosto 2014
Inicio de obras.	Agosto - Septiembre 2014
Ejecución de obras.	Diciembre 2014 - Julio 2015.



Apoyo a la Actividad Económica

Para dar cumplimiento al objetivo de **“Fortalecer la dinámica socioeconómica de sectores afectados por la catástrofe, turismo y emprendimientos en recintos dañados;”** hemos considerado el desarrollo de 2 iniciativas; apoyar con fondos a emprendedores afectados y fortalecer actividad turística.

- APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
- APOYO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.



Fortalecer la dinámica socioeconómica de sectores afectados por la catástrofe, turismo y emprendimientos en recintos dañados.



• **APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA:**

Objetivos:

Apoyo a micro y pequeñas empresas afectadas por terremoto.

Medida:

Desarrollar un Fondo Concursable "Capital Semilla Emprende", que permita entregar aportes de entre 2 y 3 millones de pesos para emprendedores que hubieren sido afectados en sus actividades por terremoto.

Monto Asignado a la medida:

\$ 194.251.000

Responsable: SERCOTEC

Plazo de cierre: Diciembre 2014.

Fuente Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDP.

Acciones:

Hitos	Plazos
Catastro de daños. Proyecto ingresado a evaluación	Abril - Mayo 2014
GORE, para aprobación recursos.	Agosto de 2014
Periodo de concurso.	Noviembre 2014
Selección de proyectos.	Diciembre 2014
Entrega de Fondos	Diciembre 2014 a Abril 2015



• **APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA:**

Objetivo:

Desarrollar iniciativas para recuperar disminución de la actividad turística producida tras el terremoto.

Medidas:

Aumentar cupos regionales para el Programa de Vacaciones 3a Edad en su modalidad intraregional y en; aumentar cupos regionales en Programa Giras de Estudio para estudiantes de Enseñanza Media, cuyo destino principal es la ciudad de Iquique, también afectada por Terremoto, la reciprocidad de destinos, compromete éxito de la medida.

Monto asignado a la medida:

\$ 135.778.631. (\$76.986.631 son aportes estatales al programa gira de estudios, \$ 31.980.000 aporte de los alumnos para gira y \$ 26.812.000 aportes estatales para el programa viajes tercera edad).

Responsable: SERNATUR.

Plazo de cierre: Abril 2015.

Fuente de financiamiento: Ministerio de Economía - SERNATUR

Acciones:

Hitos	Plazos
Difusión de programas. Programa de vacaciones 3a Edad en cupos sociales, Intra Regionales, disponibilidad de 380 cupos (se aumento en 320 cupos). Programa Giras de Estudio, disponibilidad de 836 cupos.	Junio - Julio 2014
Apoyo y gestión de programa con operadores turísticos.	Agosto - Octubre 2014
Monitoreo de programa.	Julio 2014- Abril 2015



Apoyo a los Gobiernos Locales

Para dar cumplimiento al objetivo de **“Fortalecer capacidades locales para enfrentar emergencias”**. Se tiene presente la financiación de proyectos a ser presentados por Municipalidades de la región, para alcanzar objetivos de corto alcance.

- PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE ARICA.
- PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE CAMARONES.
- PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE PUTRE.
- PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE GENERAL LAGOS.



Fortalecer capacidades locales para enfrentar emergencias.



· PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE ARICA:

Objetivo:

Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a emergencias: reparando infraestructura y adquiriendo equipamiento.

Medida:

Financiamiento de proyectos, levantados por Comuna de Arica, mediante Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, mediante subprograma de Emergencia.

Acciones:

Proyectos de:

- Habilitación de Albergues
- Iluminación Móvil para vías de evacuación y Cerro Chuño.
- Mantenimiento y recuperación de espacios públicos zona urbana o rural.
- Segregación Edificio por circulación por riesgo Morro de Arica.

Monto: \$ 142.020.777.

Responsable: Municipalidad de Arica.

Plazo de Implementación: Abril a Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Imputable como ingreso 115-13-03-002-001 .



• PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE CAMARONES:

Objetivo:

Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a emergencias: reparando infraestructura y adquiriendo equipamiento.

Medida:

Financiamiento de proyectos, levantados por Comuna de Camarones, mediante Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, mediante subprograma de Emergencia.

Acciones: Proyectos:

- Reposición generadores localidades de Pachica, Caleta Camarones y Taltape.
- Reposición generadores de emergencia Edificio Consistorial de Cuya.
- Mantenimiento y recuperación de espacios públicos de Tulapalca y Cuturata.
- Habilitación muro contención multi-cancha de Codpa.
- Recuperación y Habilitación Red Eléctrica Cerro Blanco y Ogragia .
- Recuperación sistema eléctrico fotovoltaico Albergue Escuela de Chitita.
- Mantenimiento y recuperación de espacios públicos sector Caleta de Camarones.

- Reposición de Generadores de Emergencia Edificios Públicos Localidades de Codpa y Camarones.
- Habilitación de espacios para emergencia pos terremoto comuna de Camarones.
- Recuperación sistema fotovoltaico de servicios públicos de Codpa.

Monto: \$ 264.913.000.

Responsable: Municipalidad de Camarones.

Plazo de Implementación: Abril - Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Imputable como ingreso 115-13-03-002-001.



• **PROYECTOS LEVANTADOS EN LA
COMUNA DE PUTRE:**

Objetivo:

Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a emergencias: reparando infraestructura y adquiriendo equipamiento.

Medida:

Financiamiento de proyectos, levantados por Comuna de Putre, mediante Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, mediante subprograma de Emergencia.

Acciones: Proyectos:

- Reposición de generadores eléctricos.
- Habilitación de sistema eléctrico fotovoltaico.

Monto: \$ 85.180.000.

Responsable: Municipalidad de Putre.

Plazo de Implementación: Abril -
Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Imputable como ingreso 115-13-03-002-001.



PROYECTOS LEVANTADOS EN LA COMUNA DE GENERAL LAGOS:

Objetivo:

Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para hacer frente a emergencias: reparando infraestructura y adquiriendo equipamiento.

Medida:

Financiamiento de proyectos, levantados por Comuna de General Lagos, mediante Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, mediante subprograma de Emergencia.

Acciones: Proyectos:

- Reposición de 5 estanques de 5.400 litros.
- Reposición de Baterías ciclo profundo de 12 w/100 y 150 ma para sistemas de iluminación solar y comunicación radial de las escuelas.
- Reposición de generador diesel para internado Escuela G-35 de Visvira y poblado de Chujlluta.
- Reposición de 2 estanques de acumulación de petróleo de superficie.

Monto: \$ 62.419.000.

Responsable: Municipalidad de General Lagos.

Plazo de Implementación: Abril a Diciembre 2014.

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Imputable como ingreso 115-13-03-002-001.



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile

Cuadro Resumen:

EJE	MEDIDA	PLAZO DE CIERRE			RESULTADOS A LA FECHA	RECURSOS POR EJE		
		2014	2015	2016				
Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> Reparación viviendas. Reconstrucción viviendas. Reconstrucción conjunto Guañacagua III. Reconversión urbana terreno Guañacagua III. 		2015	2016	2016	2016	805: inicio de obras (129) + asignados (676) 80 proyectos en preparación. Evaluación de proyecto de vivienda. Etapa de Pre-Inversión.	\$ 22.039.545.900
Espacios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> Reparación Morro Arica. Reparación Casa Cultura Ex Aduana Reparación Playa La Lisera. Reparación Playa El Laucho y Ex-Isla Alacrán. Estudio Diagnóstico Balnearios Laucho y Lisera 	2014		2015	2014	2014	Ejecución, 40% avance de obras Proyecto en Evaluación de Desarrollo Social Adjudicado, próximo inicio de obras. Proceso de Adjudicación, próximo inicio de obras.	\$ 3.125.853.200
Educación	<ul style="list-style-type: none"> Conservación Escuela Rancagua Reparación 7 edificios Universidad de Tarapacá. Reposición equipamiento Universidad de Tarapacá. 		2015	2015			Convenio firmado, próximo inicio de obras En asignación de recursos.	\$ 1.187.661.000
Fortalecer agricultura, recursos hídricos	<ul style="list-style-type: none"> 11 proyectos Comunidades Indígenas Concurso Conadi Concurso CNR Obras civiles en Canal LLussuma 	2014		2015	2015	2015	En ejecución, próximo inicio de obras. Etapa de concurso, formulación de proyectos. Etapa de Pre-Inversión.	\$ 1.263.414.425
Integración territorial; conectividad vial	<ul style="list-style-type: none"> 14 obras viales 	2014	2015				1 Terminada 6 obras ejecución 5 obras adjudicadas, próximo inicio de obras. 2 obras proceso adjudicación, próximo inicio de obras.	\$ 10.613.818.000
Actividad económica	<ul style="list-style-type: none"> Concurso capital semilla emprende. Aumento cupos en Vacaciones 3ª Edad. Aumento de cupos en Giras de Estudio 	2014	2014	2015			Proceso de transferencia de recursos. En licitación. En ejecución, viajes iniciados.	\$ 330.029.631
Apoyo gestión Gobiernos locales	<ul style="list-style-type: none"> 22 proyectos en 4 comunas 	2014					En Ejecución	\$ 554.532.777
TOTAL	69 iniciativas							\$ 39.114.854.933



Arica y Parinacota

CONSTRUIR UNA OPORTUNIDAD
